

MASTERPLAN 2020

Masterplan Mobiliteit Antwerpen
7^e voortgangsrapportage
27 november 2014



Structuur presentatie

- MP2020: MOW- en BAM-projecten
Bert De Bondt
- Oosterweelverbinding
Jaak Polen

Inleiding

- Situeren 7^e voortgangsrapportage
 - Stand van zaken Masterplan 2020 projecten
 - Evolutie sinds 6^e voortgangsrapportage 27 maart 2014
 - Oosterweelverbinding
 - Dading
 - Voorbereiding project:
 - Ontwerp
 - GRUP
 - Onteigeningen
 - Nutsleidingen
 - ESR / kostprijs / financiering
 - Risicobeheersing
 - Planning
- Projectfiches
 - Actualisaties
 - O.a. timing en kostprijs
- Overzichtstabel

- Wegenprojecten
- Openbaar vervoer projecten
- Bruggen Albertkanaal
- Royerssluis
- Fietsprojecten



agentschap

Wegen en Verkeer

nv De Scheepvaart 




departement

Mobiliteit en
Openbare Werken



beheersmaatschappij
antwerpen mobiel

Wegenprojecten

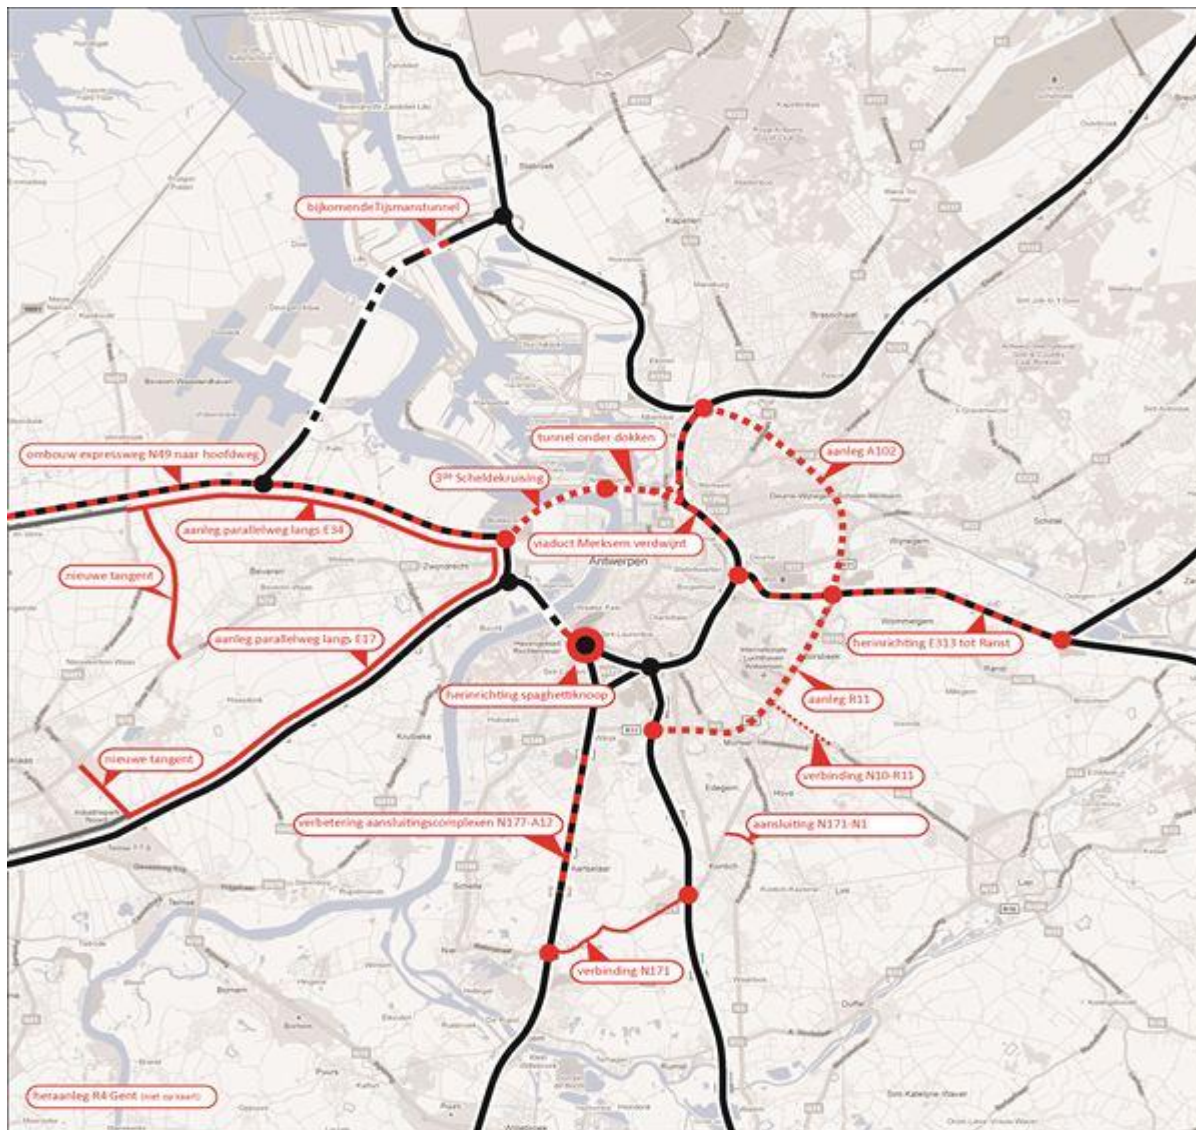

Wegenprojecten

- E34/E313:
 - Ontwerp Plan-MER ter inzage: oktober 2014
 - GRUP – project-MER – vergunning : 2015
 - Start werken: vanaf 2016

- A102/R11bis
 - Plan-MER: 2^e aanvullende richtlijnen 28/10/2014: nog 9 alternatieven die niet ‘onkansrijk’ zijn.
 - Boniverlei – Antwerpsesteenweg (N1-N171) af te stemmen op A102-R11bis

Wegenprojecten

- **Waasland**
 - Plan-MER parallelwegen o.b.v. mobiliteitsstudies plan-MER Oosterweelverbinding 2015
- **N49**
 - Fietspaden, ventwegen, bruggen, tunnel, aansluitingscomplex, bochtverbetering
- **R4-Oost**
 - Afgerond: tijdelijke aanpassing R4 X N42 en fietsbrug knooppunt 9
 - Complex Langerbruggestraat: aanbesteed / start begin 2015
 - Overige kruispunten PPS met R4 -West

Wegenprojecten

- Spaghettiknoop
 - Ondersteunende studie en technische voorstudie: medio 2014 opgestart
 - MER-procedure: eind 2014 – eind 2015
- Doortrekking N171
 - In uitvoering
- Brug Geel Oevel (NZ Kempen): afgerond


Openbaar vervoer projecten

- Brabo 1:
 - Afgerond
 - Kosten verrekend voor: vernietiging stedenbouwkundige vergunning Deurne-Wijnegem en stelplaats Deurne
- Brabo 2:
 - Tramlijnen Noordelijke Leien, Noordplaats-Havannasite, Eilandje
 - BAFO's ingediend september 2014
 - Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: mei 2014
 - Start werken: 1^e helft 2015
 - Overdracht gewestwegen goedgekeurd

Openbaar vervoer projecten

- Mortsel-Kontich en Wilrijk-E19
 - Studiebesteding gepubliceerd, toewijzing voor zomer 2015

Bruggen Albertkanaal

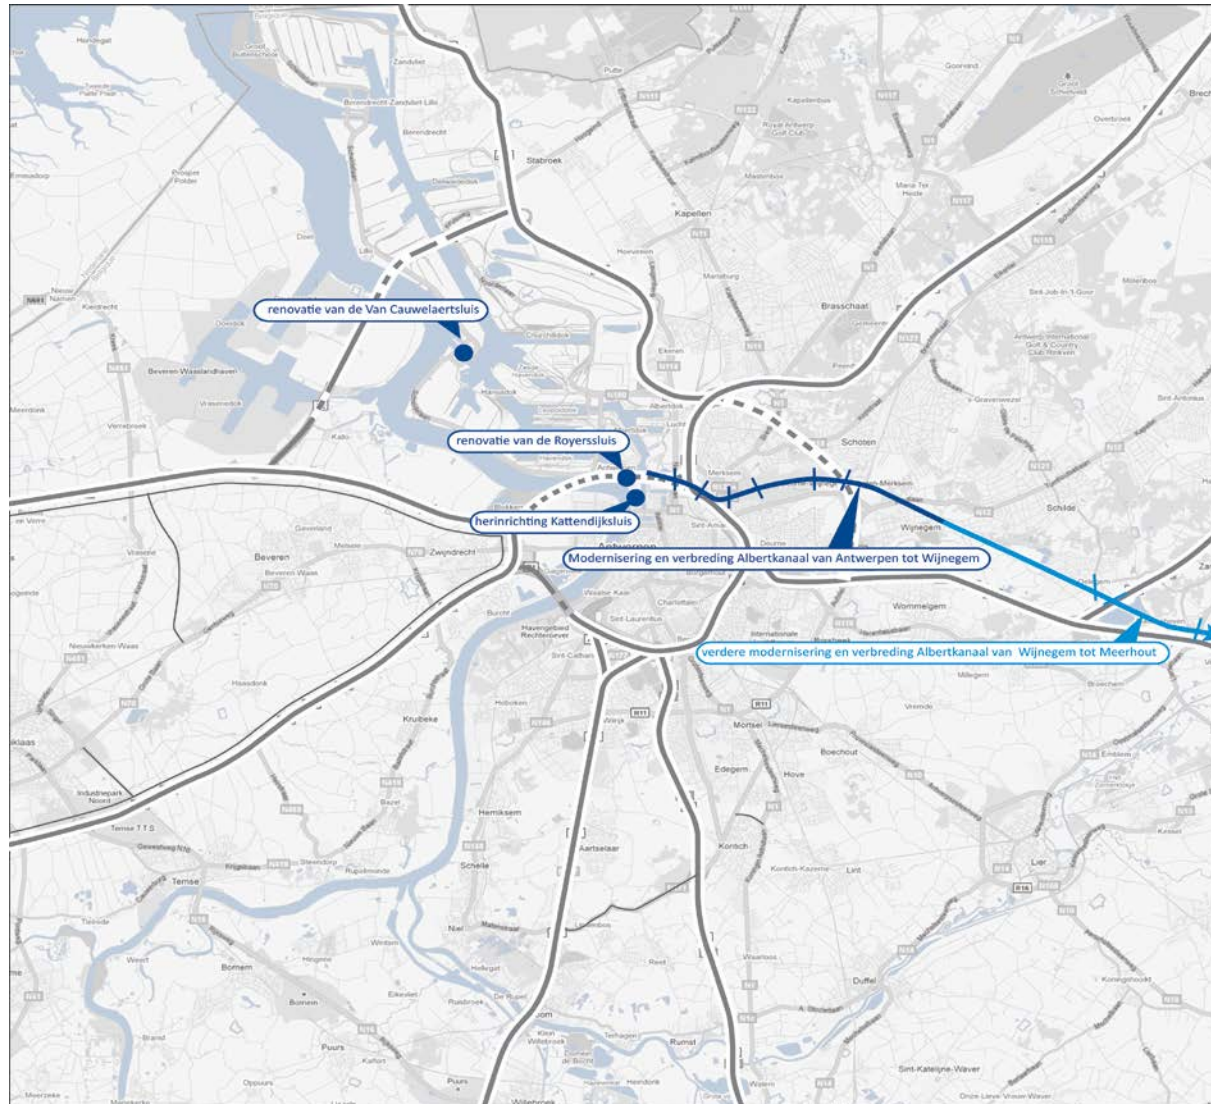

Bruggen Albertkanaal

- Afgerond: 8 bruggen
- Spoorbruggen: klaar voorjaar 2015
- In uitvoering: 6 bruggen
- Start uitvoering 2014
 - Brug Olen-Hoogbuul (herbouw)
 - Wijnegem Houtlaan(verhoging)
- 7 Masterplan-bruggen: alternatieve financiering
 - Overeenkomst met Via-Invest:
 - Technische uitwerking
 - Administratief-juridische uitwerking
 - Vanaf 2015 in de markt geplaatst
 - Uitvoering: 2016-2020

Royerssluis




- Voorontwerpstudie: afgerond
- Actualisatie MKBA + aanvullende nota 36 m. variant
- Keuze variant door VR
- Afstemming op project Oosterweelverbinding
- EU-subsidies

Fietspaden BAM

- Afgerond
 - Havenroute: o.a. Berendrecht-Zandvliet (- verlichting)
 - Hoboken-Hemiksem: VIIe Olympiadelaan en De Bruynelaan (voorlopig opgeleverd)
 - Linkeroever-Beatrijslaan-Burch: Kruibeeksesteenweg en Beatrijslaan-Astridlaan (voorlopig opgeleverd)
- In uitvoering
 - Havenroute
 - Hoboken-Hemiksem
 - Linkeroever-Beatrijslaan-Burcht
 - Districtenroute (delen in studiefase, start najaar 2014)

Fietspaden MOW / AWW

- Gordel Randgemeenten ,
Spoorlijn Lier-Antwerpen en
Vremde-Borsbeek-Berchem
 - Startnota's opgemaakt: tracé,
gewenste inrichting, flankerende
maatregelen
 - Interacties met andere projecten:
herinrichting dorpskern, rioleringen
 - Initiatief bij wegbeheerder
 - Reguliere subsidies
- Albertkanaal
 - Samen met verbreding Albertkanaal
- Ringfietspad
 - Afstemmen op
Ooosterweelverbinding,
Spaghettiknoop, IJzerlaanbrug

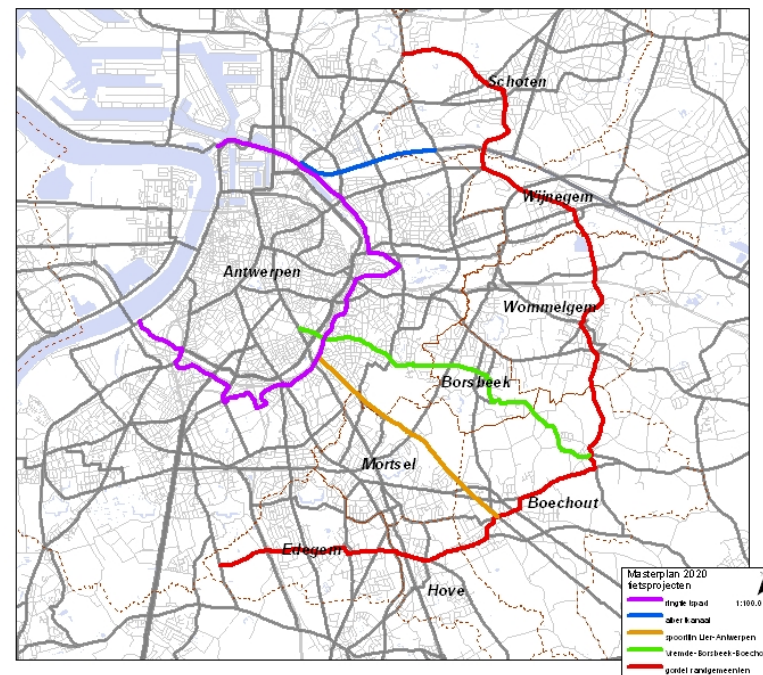


Masterplan 2020



Oosterweelverbinding



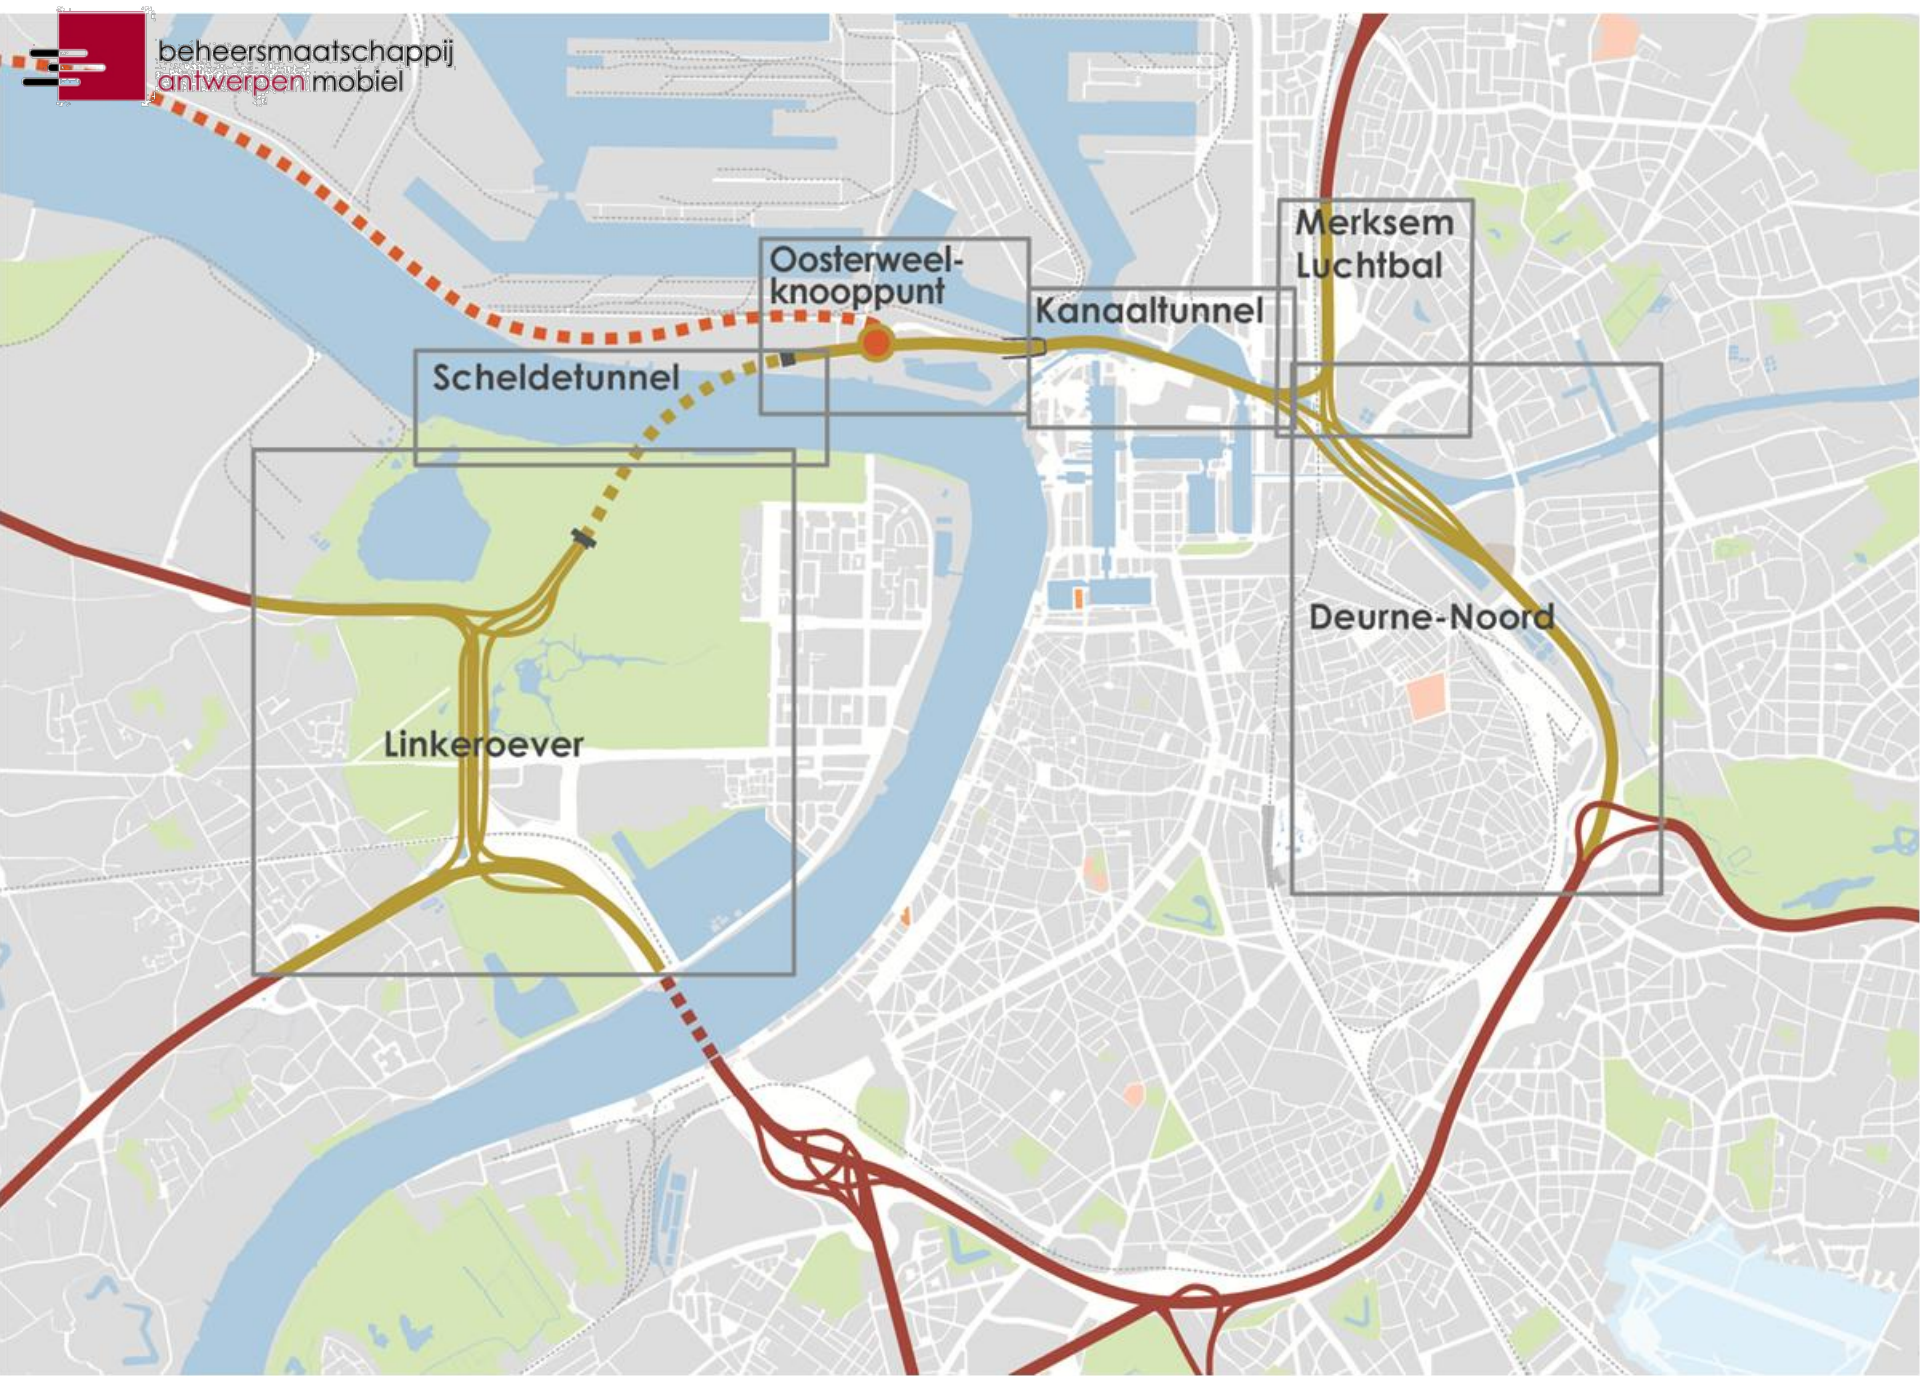







beheersmaatschappij
antwerpen mobiel




Oosterweelverbinding

- **Beslissing Vlaamse Regering 14 februari 2014**
 - Tracé Oosterweelverbinding
 - Tunnel R1 onder Albertkanaal, C&C-concept, Schijnpoort
 - Gedifferentieerde tol
- **Noriant**
 - Dading afgesloten op 20 oktober 2014
 - Treedt in werking als er tegen 15 december 2014 geen comfort bekomen is van de Europese Commissie om gereduceerde opdracht aan Noriant te gunnen
 - Vlaams Gewest heeft samenvattende nota op 14 november ingediend bij de Europese Commissie

Oosterweelverbinding

- **Verfijning conceptontwerp**
 - Quick Scan RoTS overkapbaarheid R1 (projectzone Oosterweelverbinding)
 - Projectontwerp aanpassen zodat een overkapping mogelijk is
 - Kostprijs: 29 miljoen euro
 - Verlenging tunnel R1/Albertkanaal
 - Tunnel verlengen met 200 m naar het zuiden
 - Kostprijs: ca. 30 miljoen euro

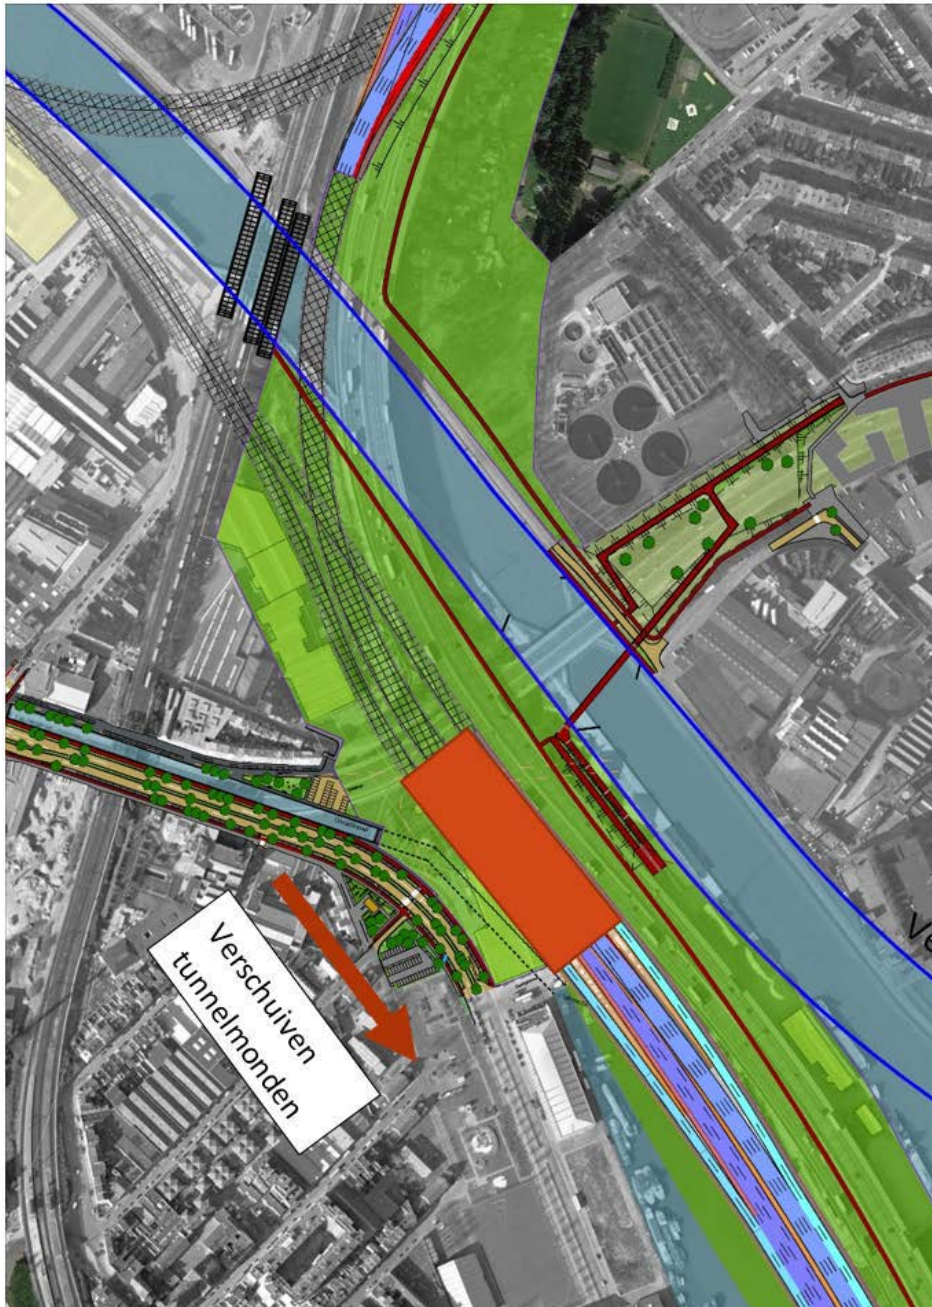

Verlenging tunnel Albertkanaal/R1

Oosterweelverbinding

- **Procedures**

- GRUP-procedure
 - Openbaar onderzoek afgelopen. Resultaten worden verwerkt
- Project MER Bouwdok Zeebrugge
 - Kennisgeving wordt dit jaar ter inzage gelegd
- Project MER Oosterweelverbinding
 - Bekendmaking studieopdracht gepubliceerd op 28 oktober 2014
 - Offertes verwacht tegen 19 december 2014
- Stedenbouwkundige vergunningen
 - Sloopvergunningen voorbereidende werken aangevraagd en bekomen

Oosterweelverbinding

- **Onteigeningen**

- Pas mogelijk na de definitieve vastlegging van GRUP en het bekomen van onteigeningsmachtiging
- Liggen op het kritieke pad

Oosterweelverbinding

- **Nutsleidingen en afvoerleidingen (1)**
 - Voorbereidende werken rechteroever
 - Indienen bouwaanvraag begin december 2014
 - Start voorbereidende werken in augustus 2015
 - Stand van zaken voorbereidende leidingwerken
 - » Aanpassing Groot Schijn
 - » Pompstation Klein Schijn
 - » Aanpassing Aquafin-collectoren
 - » Aanpassing afvoer pompgemaal PS2 'Stenen brug'
 - » Heraanleg Noordersingel

Oosterweelverbinding

- **Nutsleidingen en afvoerleidingen (2)**
 - Stand van zaken verplaatsen nutsleidingen
 - » Nutsleidingentunnel 'IJzerlaanbrug'
 - » Nutsleidingentunnel 'Schijnpoortweg'
 - » Nutsleidingentunnel 'Groenendaallaan'
 - » Nutsleidingentunnel 'Albertkanaal'
 - » Aanpassing bestaande nutsleidingentunnel 'Turnhoutsebaan'
 - Project IJzerlaan-IJzerlaanbrug
 - » Verplaatsingsbevelen aan nutsbedrijven op 1 oktober 2014 uitgestuurd
 - Oosterweelverbinding
 - » Verplaatsingsbevelen op 16 oktober 2014 uitgestuurd
- Liggen op het kritieke pad

Oosterweelverbinding

- **Lobroekdok**
 - Sanering gebeurt in 2015
 - Reductie boten van 66 naar 35
 - Aanbesteding aannemer bergings- en sloopwerken lopende
 - BAM politionele bevoegdheid
- **Afwateringskanaal Lobroekdok:**
 - IJzerlaanbrug vervangen door Fietsbrug (2 jr. vervroegd)
 - IJzerlaankanaal: afwatering en stadsontwikkeling
 - Samenwerkingsovereenkomst BAM, AWW, De Scheepvaart en stad Antwerpen
 - Bouwaanvraag: in opmaak
 - Start werken: maart 2015
- **Bouwdok Zeebrugge**
 - Aparte project-MER opgestart


Oosterweelverbinding

- **Bijkomende opdrachten aan BAM**
 - Ondersteunend studiewerk quick wins (buiten Masterplan 2020)
 - Minder hinder
 - Coördinatie belangrijkste werken
 - Maatregelen om bereikbaarheid van Antwerpen tijdens de hinder te garanderen


Oosterweelverbinding

- **Royerssluis**
 - Gelijktijdige uitvoering met Oosterweelverbinding
 - Stuurgroep Royerssluis zorgt voor afstemming
- **Projectteam financiering/structurering**
 - Concessie aan TLH niet langer een optie door nieuwe ESR2010 regels
 - Projectteam onderzoekt mogelijke scenario's voor financiering

Planning (1)

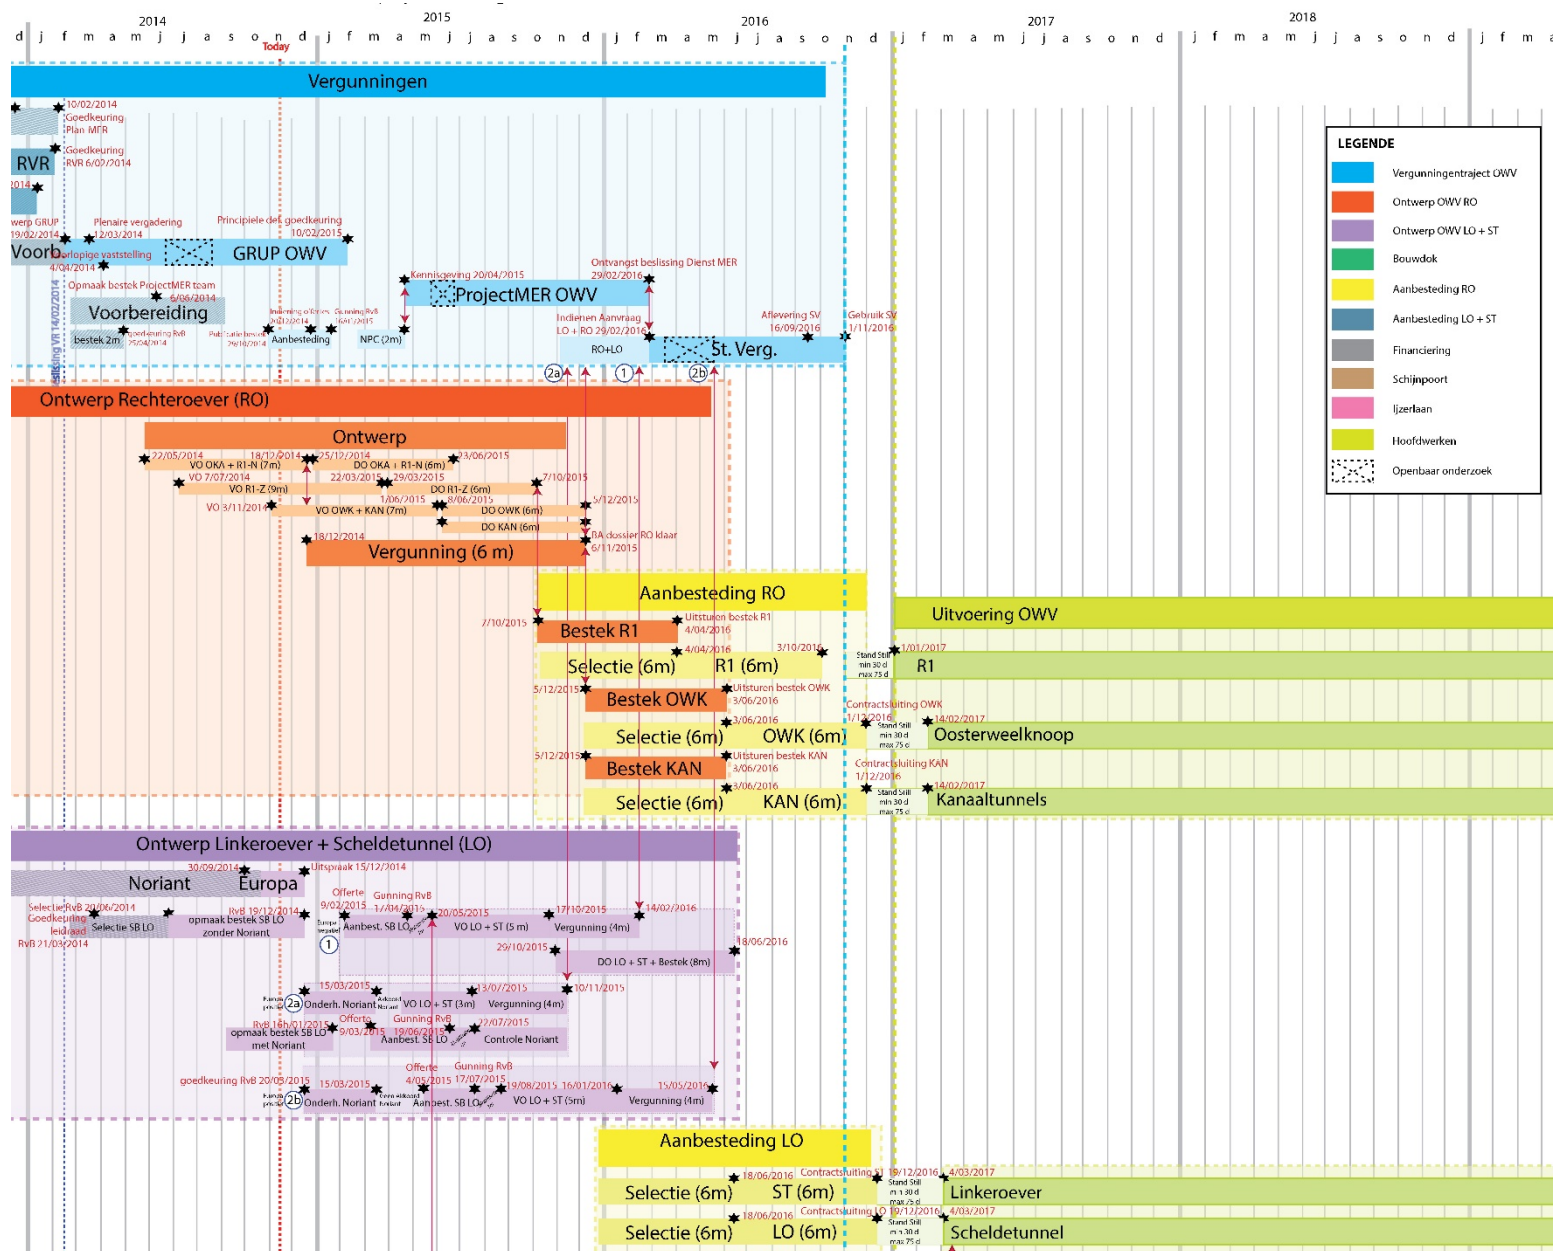

Planning (2)

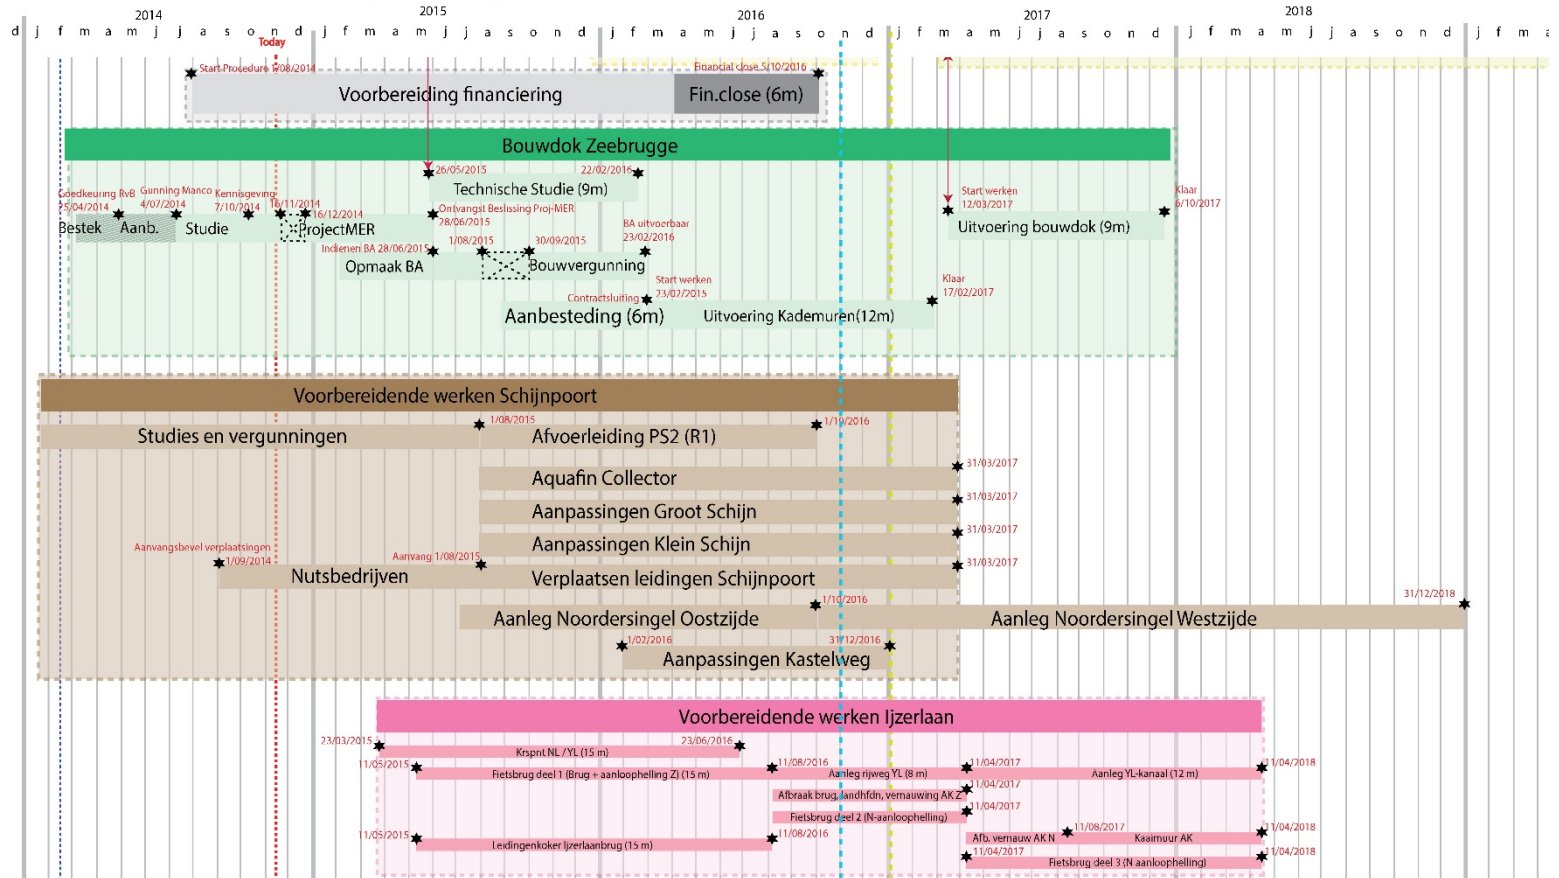

Oosterweelverbinding

• Kostprijs Infrastructuur

<i>(mln €)</i> <i>prijspeil</i> <i>index</i>	Haalbaarheidsstudie		Conceptontwerp	verschil
	<i>01/2010</i> <i>100</i>	<i>10/2012</i> <i>108</i>	<i>10/2012</i>	<i>10/2012</i>
Linkeroever/Scheldetunnel	877	947	947	0
Rechteroever	2188	2363	2050	-313
Totaal	3065	3310	2997	-313

• Bijkomende kosten

- Tunnel Albertkanaal : 185 mln Euro
- Extra milderende maatregelen : 17 mln Euro
- Niet-hypothekeren toekomstige overkapping R1: 29 mln euro
- Verlengen R1-tunnel onder Albertkanaal: 30 mln euro
- Geactualiseerde ramingstabellen per projectonderdeel zijn in opmaak

• Resultaat :

- Uitvoeringsvarianten, milderende maatregelen en aanpassingen kunnen wellicht gedragen worden binnen taakstellend budget zoals bepaald door Vlaamse regering in september 2010

Oosterweelverbinding

- **Risicobeheersing**

- Risico's RoTS
- Planningsrisico's
 - Aanstellen van het team voor Project-MER (procedure loopt)
 - Opmaak Project-MER en voornamelijk externe factoren
 - Vastleggen van de klanteneisen (proces loopt volgens verwachting)
 - Voorontwerp en definitief ontwerp (voorontwerp loopt)
 - Dossier Noriant en de studies voor Linkeroever en de Scheldetunnel (evenals de procedure tot aanstellen van een studiebureau)
 - Onteigeningen voor voorbereidende werken, inclusief mogelijke verontreinigingen
 - Voorafgaand archeologisch onderzoek (vooronderzoek loopt).
 - Onduidelijkheid over financiering en aanbestedingsvorm
