



Negende voortgangsrapportage Masterplan 2020

Controlebevindingen Rekenhof



Ontwikkelingen sinds de 8^o voortgangsrapportage


- Aanstelling intendant overkapping
- Start voorbereidende werken Ijzerlaan
- Brabo 2 startklaar
- Oosterweel expliciet toegevoegd aan meerjarenraming




Waar we reeds lang opwachten:

- Plan –MER en concretisering A102 + R11bis
- Onderzoek ESR-neutraliteit alternatieve financieringen R₄-oost, Albertkanaalbruggen, Royerssluis
- Notificatie Europa gedifferentieerde tol


Evolutie planning t.o.v. basisrapportage

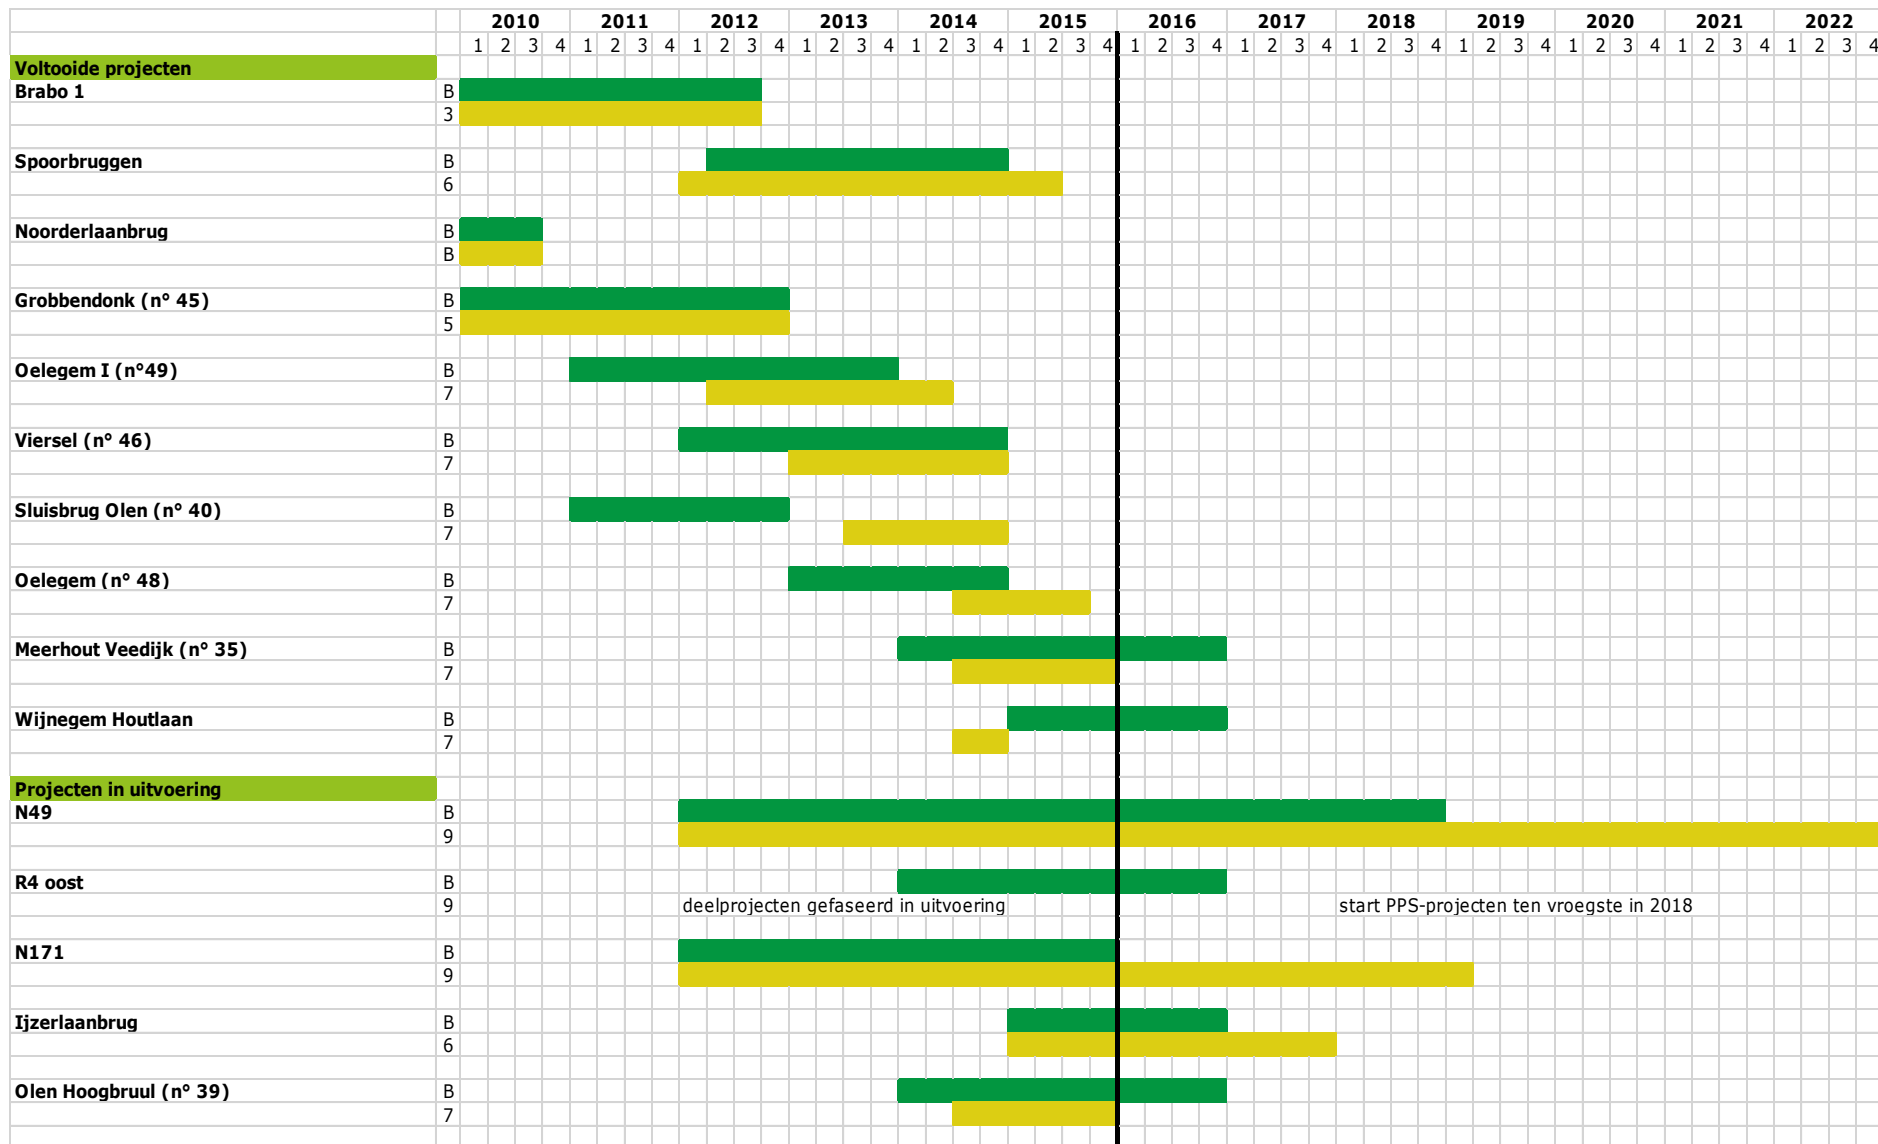

Evolutie planning t.o.v. basisrapportage

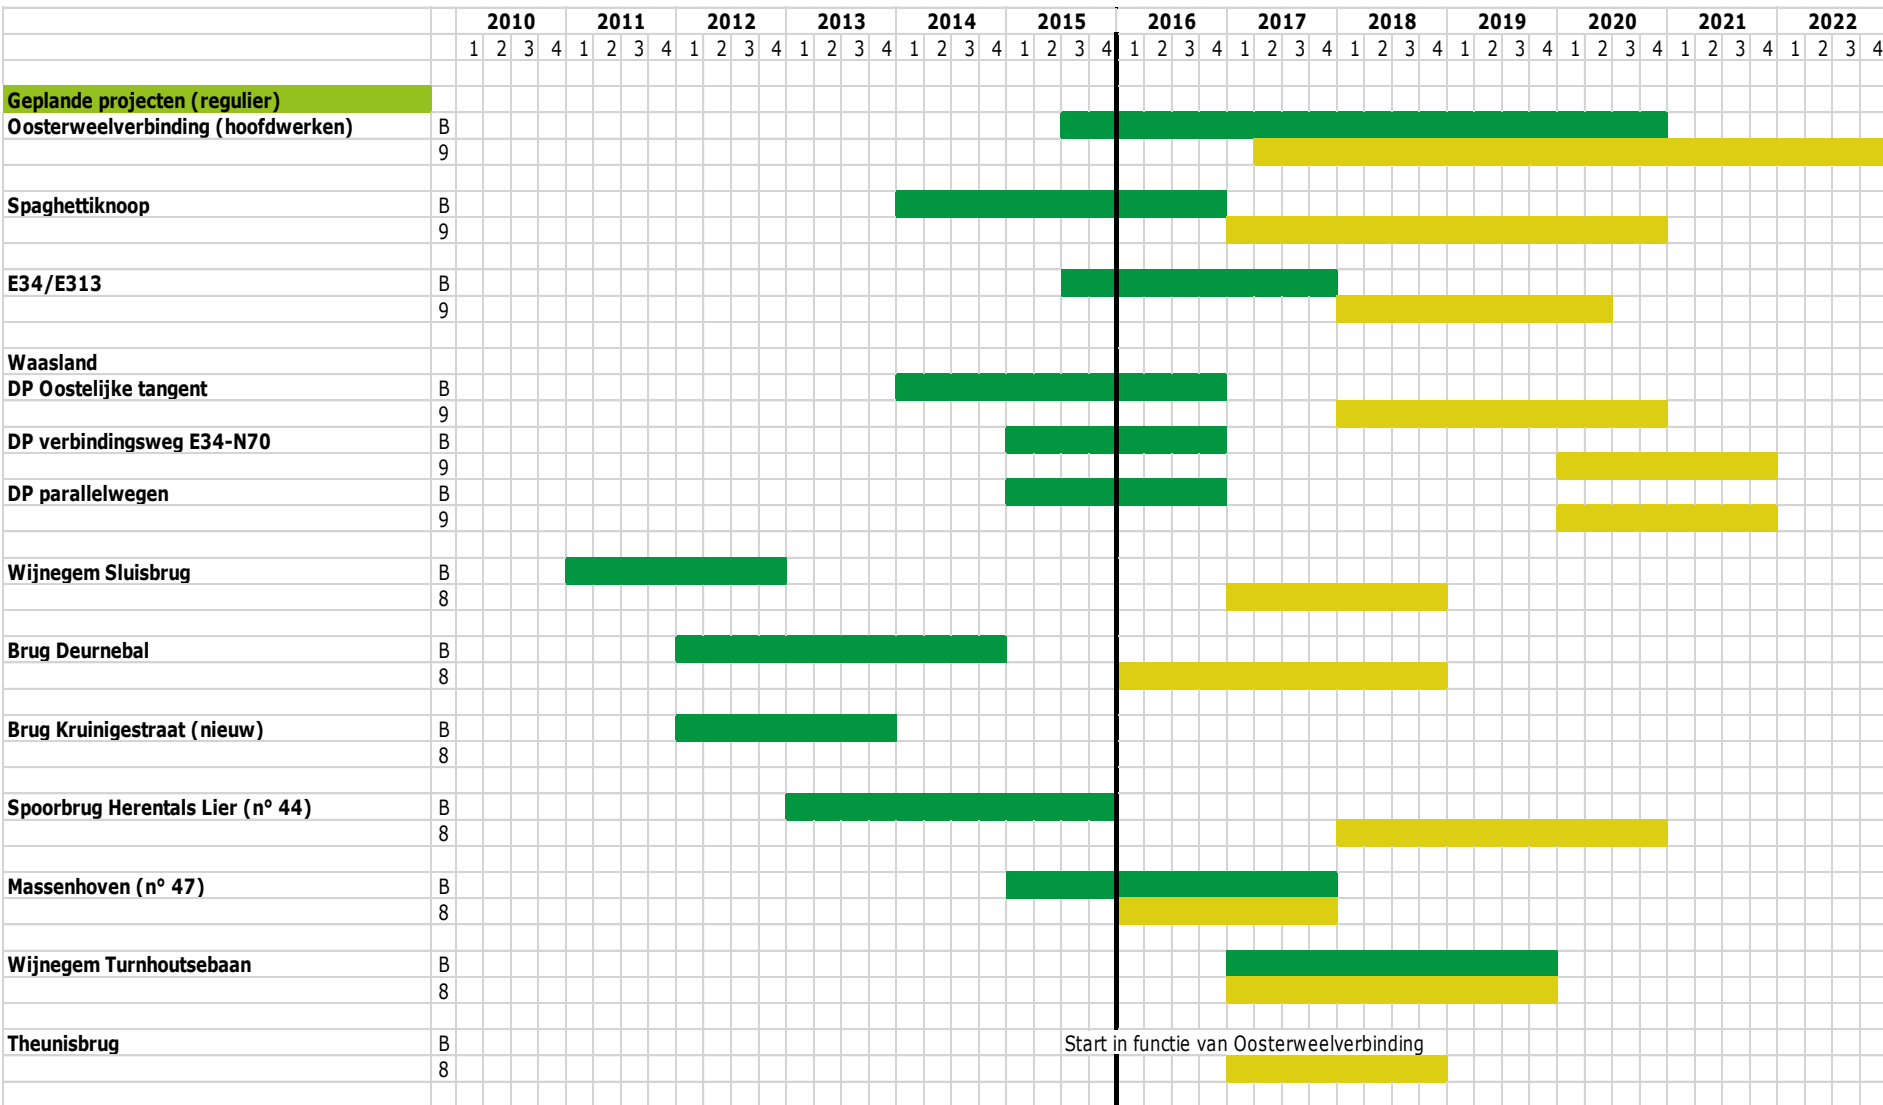

Evolutie planning t.o.v. basisrapportage

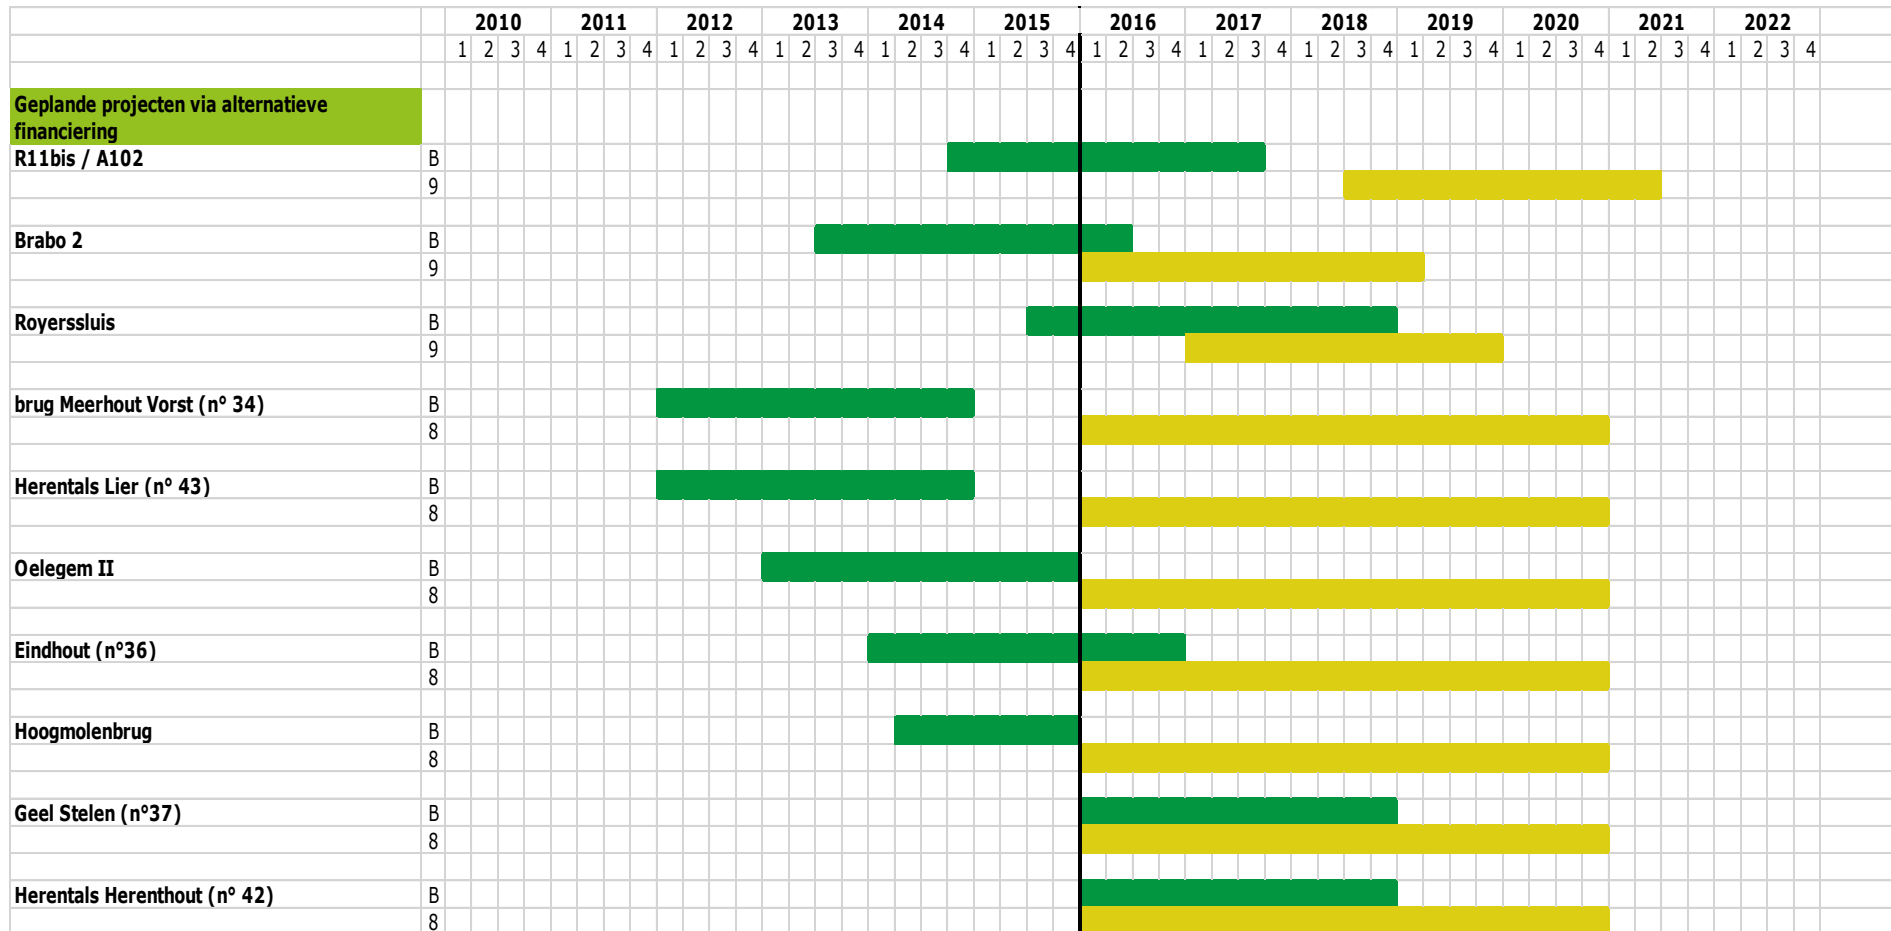



Voortgang projecten

Gestage vertraging projectplanning t.o.v. basisrapportage Masterplan 2020 omwille van

- Optimistische planning
- Complexiteit en doorlooptijd studies en vergunningenprocedures
- Bijsturing projectambities
- Juridische procedures
- Onzekerheid over budgettering
- Alternatieve financieringsformules

Meerjarenraming & Oosterweelproject

- Oosterweel expliciet toegevoegd aan meerjarenraming : effect op toekomstige beleidsruimte duidelijk

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrije beleidsruimte Zonder O.W.	-291,7	253,9	-357,3	981,8	1.488,7	2.096,6
Bouwkost oosterweel		388	568,5	567,8	567,1	368,4
Vrije beleidsruimte Met O.W.	-291,7	-136,3	-940,7	376,3	857,6	1.639,1
Beloofde begrotingstraject		0	0	0	0	0



Meerjarenraming & Oosterweelproject

Aankondiging dat het afgesproken begrotingstraject niet zal gerespecteerd ten belope van de bouwkost van Oosterweelproject

- Zes weken na indiening ontwerpbegrotingsplan
- Ondanks afgesproken convergentietraject in stabiliteitsprogramma
- Ondanks herhaalde beloften Vlaamse Regering om vanaf 2017 een begrotingsevenwicht te respecteren
- Geen overleg conform het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013
- Niet meerekenen in beleidsruimte wegens terugverdieneffect, doch tolinkomsten pas vanaf 2022



Samenwerkingsakkoord van 13 /12/ 2013

- Wettelijke verankering evenwichtsdoelstellingen & aanpassingstraject zoals opgelegd door EU
- Verdeling begrotingsdoelstellingen over de overheden op advies van HRF
- Evaluatie naleving door HRF
- Bij niet naleving moet ieder overheid binnen de 18 maanden correctiemaatregelen nemen
(advies HRF over omvang verplichtingen)
- Bij financiële sancties : verdeling op advies HRF



Niet Oosterweelprojecten

- **Niet Oosterweelprojecten Masterplan 2020 moeten gefinancierd worden binnen marges constant beleid**
 - Moet nog verduidelijkt worden in jaarlijkse begrotingen en investeringsprogramma's
 - Politiek Stuurcomité vraagt prioritering masterplanprojecten



Aanbevelingen

1. Afgesproken begrotingstraject aanhouden
2. ESR-vorderingensaldo Vlaamse overheid afstemmen met andere regeringen en eventuele bijsturing stabiliteitsprogramma
3. Uitvoeringsplanning projecten nauwer beheersen en vertragingen duiden in voortgangsrapportage

