



Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

**Commissie Algemeen Beleid, Financiën,
Begroting en Justitie, 22 maart 2022**

Onderwerp

5 documenten, zoals geagendeerd als **MED VR** en gepubliceerd op de [website Vlaamse Veerkracht](#) op **28/01/2022**

- 3^{de} voortgangsrapport op **meetmoment** 31/12/2021: bundel van gedetailleerde fiches over de 180 relanceprojecten
- Samenvattende covernota
- Nota impactindicatoren
- Overzicht outputindicatoren
- Update dashboard Vlaamse Veerkracht

April 2022: financiële rapportage van de **definitieve uitvoeringsgegevens** over 2021

1 Juni 2022: volgende **meetmoment**

Aandachtspunten meting 2 en verwerking ervan in meting 3


- Rapporteringsdata ontsluiten als **Open Data**
 - Alle data m.b.t. meting 3 als open data via het opendataportaal van de Vlaamse overheid;
- Blijvende investering in **kwaliteitsverbetering** m.b.t. de projectfiches, en de output-, outcome-, en impactindicatoren en mijlpalen
 - Voorbereidingen van meting 3 **vroeg opgestart** met informatiesessies in november 2021 om de voortgang extra te stimuleren;
 - **Kwaliteitscheck** tussen meting 2 en meting 3;
- **Narratief** m.b.t. het relanceplan, met aandacht voor het grotere systemische verhaal en de globale doelstellingen, met link naar transitie van verduurzaming en digitalisering
 - Narratief Vlaamse Veerkracht geeft de samenhang tussen de speerpunten, clusters en projecten weer;
- Kwaliteitsvolle rapportering over de **Europees gefinancierde RRF-projecten**
 - 55 RRF-projecten worden van heel nabij opgevolgd met de verantwoordelijke beleidsdomeinen;
 - Maximaal hergebruik van informatie voor Europese rapportering;

Aandachtspunten meting 2 en verwerking ervan in meting 3

- Blijvende investering in het **relancedashboard**
 - Dashboard Vlaamse Veerkracht: verder aangevuld, publiek ontsloten + geregelde updates
- **Betrokkenheid** van de relancecomités, klimaatexpertenpanel en de sociale partners tussen de metingen
 - Relancecomités, het klimaatexpertenpanel, sociale partners betrokken bij gehanteerde impactindicatoren en narratief
- Effectieve **communicatie** rond het relanceplan Vlaamse Veerkracht, de verwezenlijkingen en de impact, toegespitst op de verschillende doelgroepen
 - In 2021 verder geïnvesteerd in **publiekscommunicatie**, ook via sociale media en website Vlaamse Veerkracht
 - Vlaamse Regering plant medio 2022 een **nieuwe publiekscampagne** + internationale communicatie

Evolutie status projecten drie metingen 2021

■ Nog niet opgestart ■ Opgestart ■ Opgestart na agendering VR ■ Aandacht nodig ■ Gerealiseerd

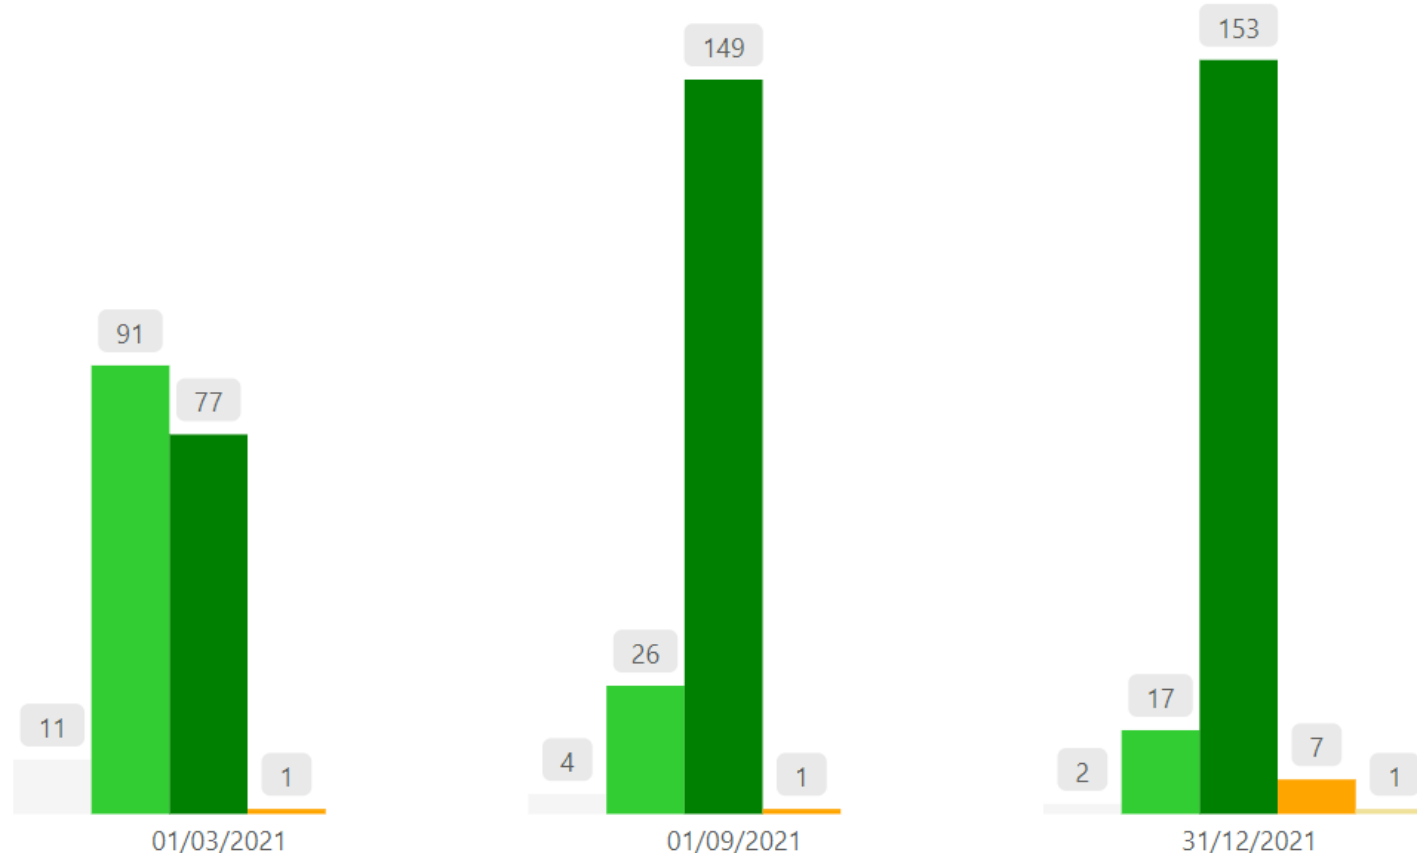


- Op 31/12/21 zijn 171 van de 180 relanceprojecten (95%) opgestart:
 - 153 opgestart na agendering VR
 - 17 opgestart (maar nog niet geagendeerd)
 - 1 gerealiseerd
- Voor 7 van de 180 relanceprojecten is **bijzondere aandacht** nodig (oranje).
- 2 relanceprojecten zijn nog niet gestart.
- **Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus 'rood', waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.**




Vlaamse
overheid

Status mijlpalen meting 3, 31 december 2021

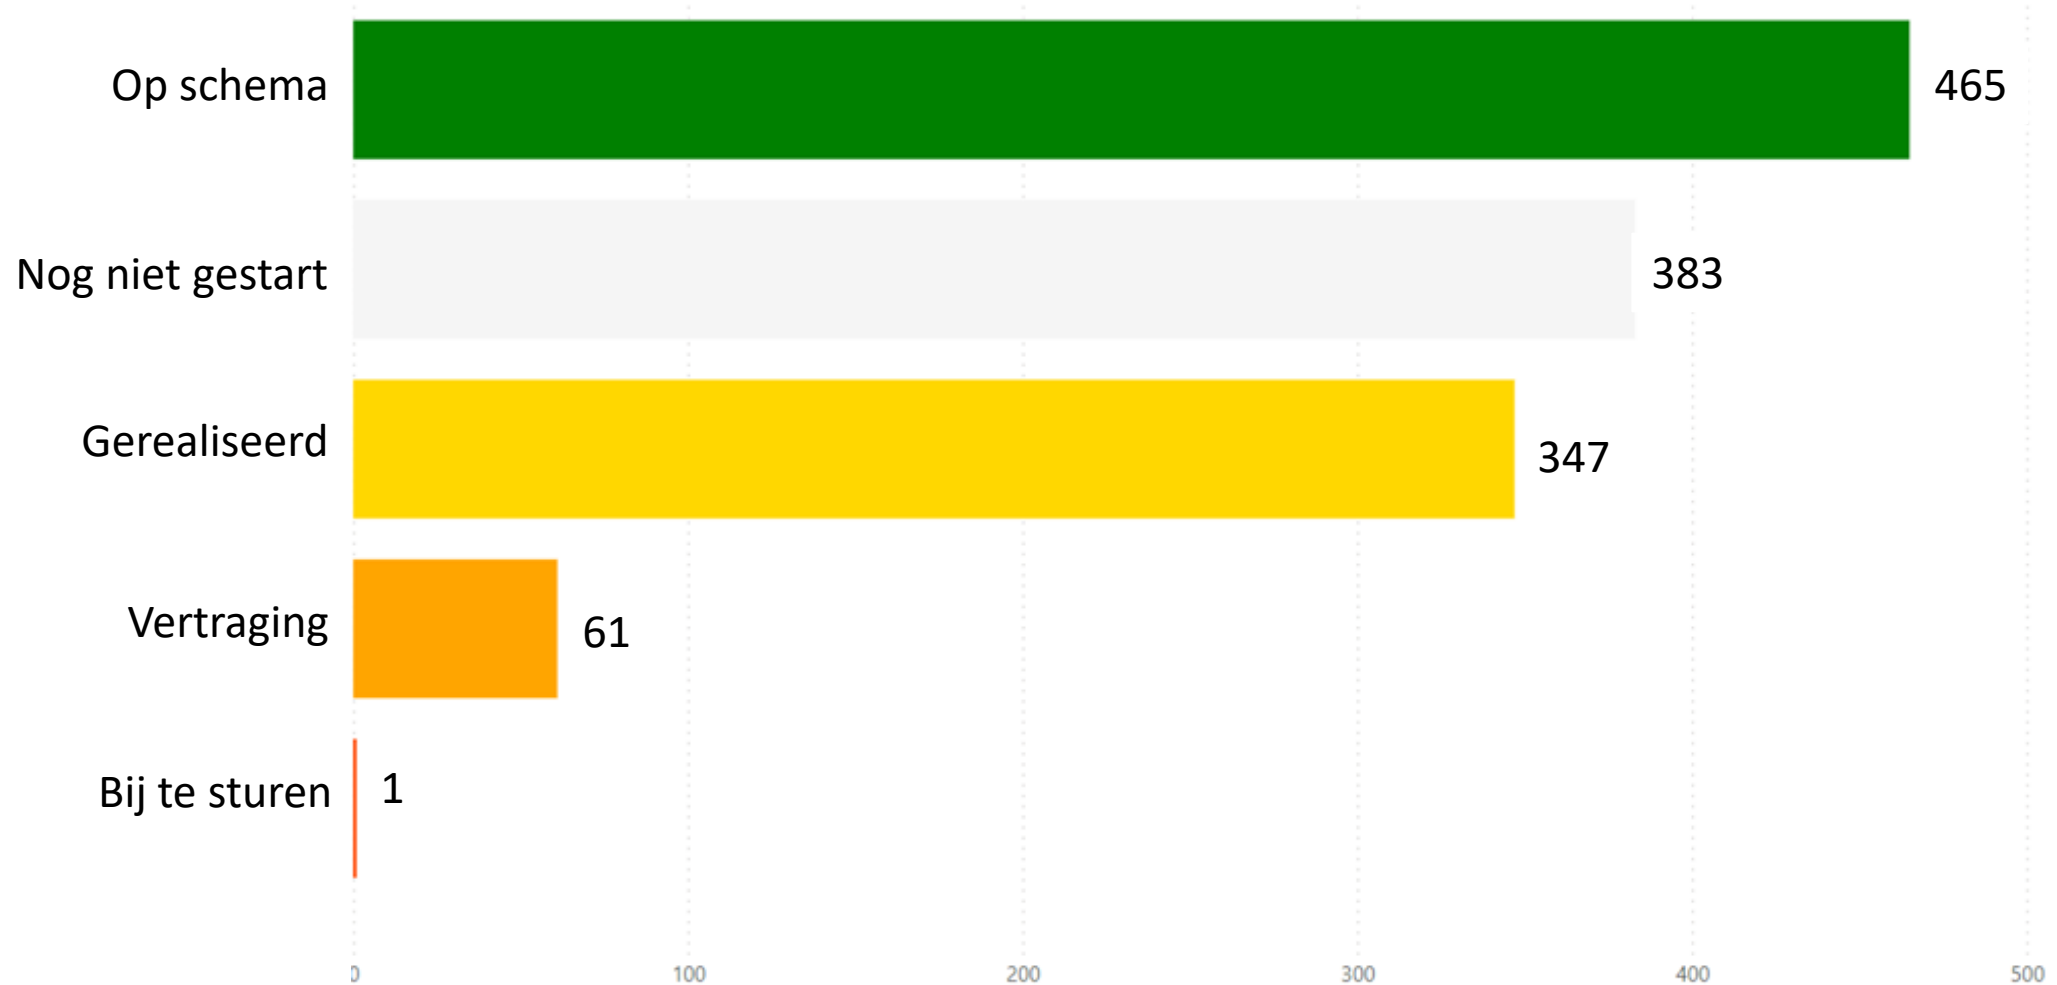

Vlaamse
overheid

Status mijlpalen meting 3, 31 december 2021

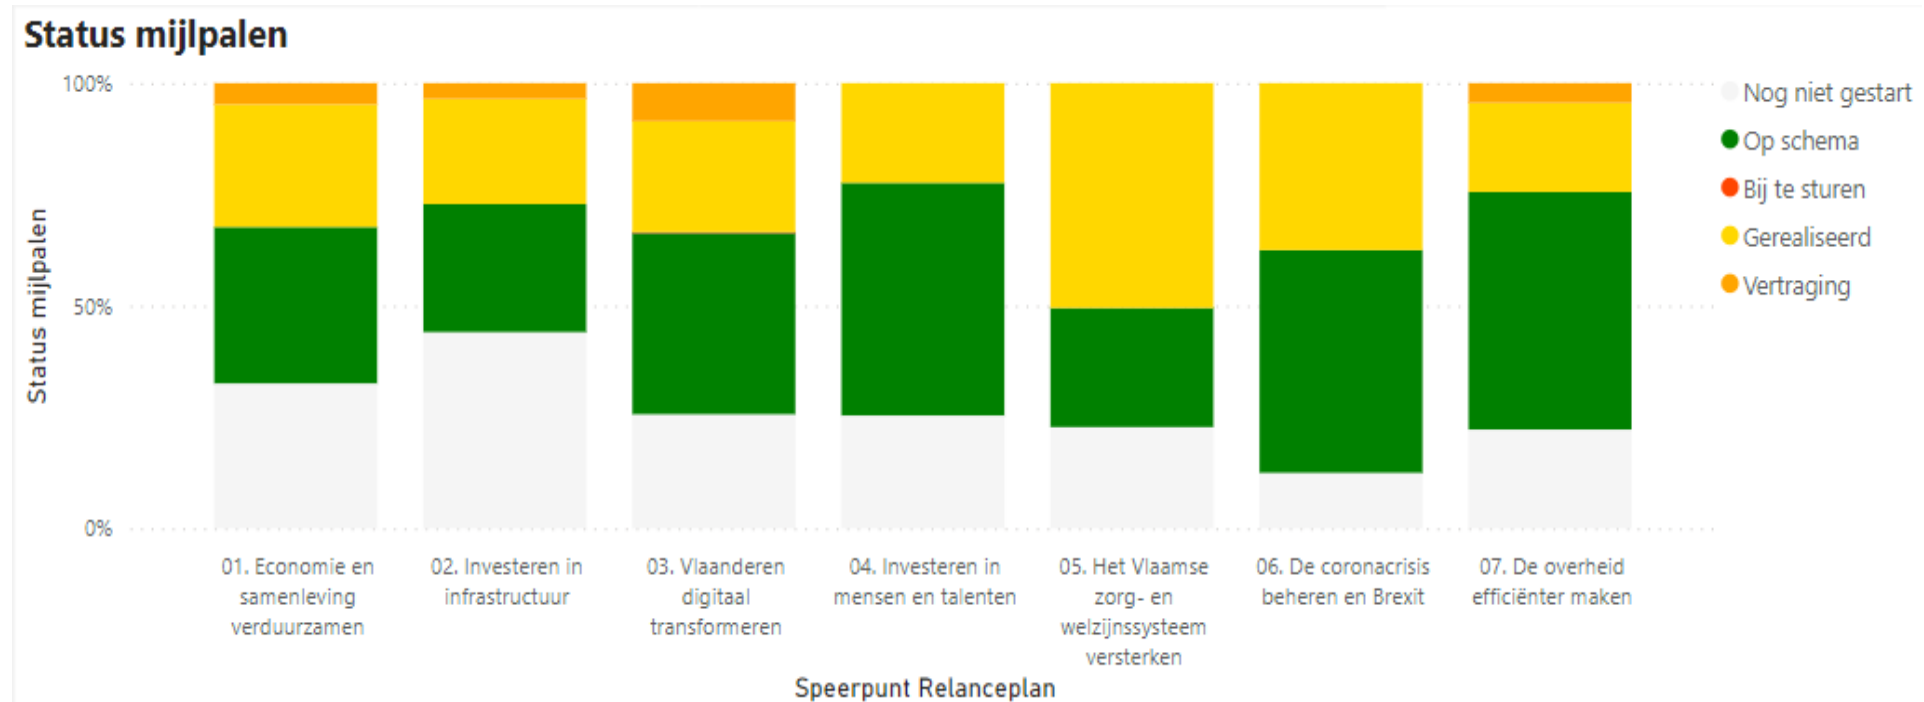

- Meeste speerpunten op **gelijk niveau** qua aangevatte mijlpalen (70-80%)
- Speerpunt 2 'Investeren in infrastructuur': nog **relatief veel mijlpalen in de toekomst**
- Speerpunt 3 'Vlaanderen digitaal transformeren': grootste aandeel **mijlpalen in vertraging**
- Speerpunt 5 'Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken': grootste aandeel **gerealiseerde mijlpalen**
- Speerpunt 6 'De coronacrisis beheren en Brexit': reeds **relatief veel gerealiseerde mijlpalen** en mijlpalen op schema

Communicatie over Vlaamse Veerkracht

- De Vlaamse Regering plant medio 2022 een nieuwe publiekscampagne. Terwijl de eerste campagne in de zomer van 2021 het bestaan en de ambitie van het relancebeleid onder de aandacht bracht, zal de volgende publiekscampagne focussen op concrete realisaties.
- De Vlaamse Regering communiceert in 2022 ook op internationaal vlak over haar herstelbeleid.
- Website www.vlaanderen.be/vlaamseveerkracht met geactualiseerd relancedashboard



Vlaamse Veerkracht

COVID-19 heeft de wereld en ook Vlaanderen hard getroffen. Daarom investeert de Vlaamse Regering de komende jaren 4,3 miljard euro om zijn economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen. 'Vlaamse Veerkracht' is daarmee het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet. Een investering van 4,3 miljard in heel uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. Maar vooral een investering in elke Vlaming.



Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Een eerste rapportering over de voortgang van deze projecten werd uitgevoerd in april 2021, een tweede in september 2021.

Projecten in de kijker



Meer inzicht in je energieverbruik dankzij de digitale meter
De digitale meter is een cruciale stap in onze energietransitie.



Digitaal leren en experimenteren in Muntpunt
Iedereen naar Muntpunt. In Brussel? Als het van Vlaamse Veerkracht afhangt wel!



Onze laadinfrastructuur uitbreiden is een topprioriteit
Overstappen naar een duurzaam mobiliteitsmodel? Dat kan alleen met een uitgebreide laadpaalinfrastructuur.




Sportsport voor meer topsportinfrastructuur!
Ervan zorgen dat onze sportinfrastructuur topklasse is, ook dat is Vlaamse Veerkracht.

Status VAK / VEK meting 3, 31 december 2021


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

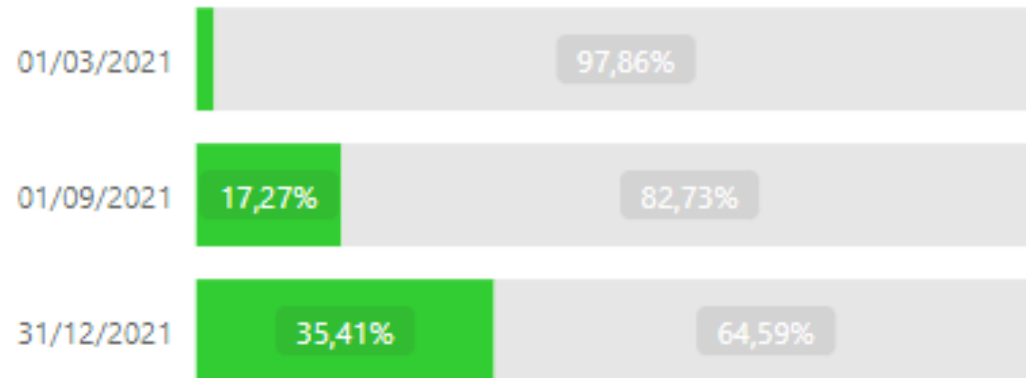

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

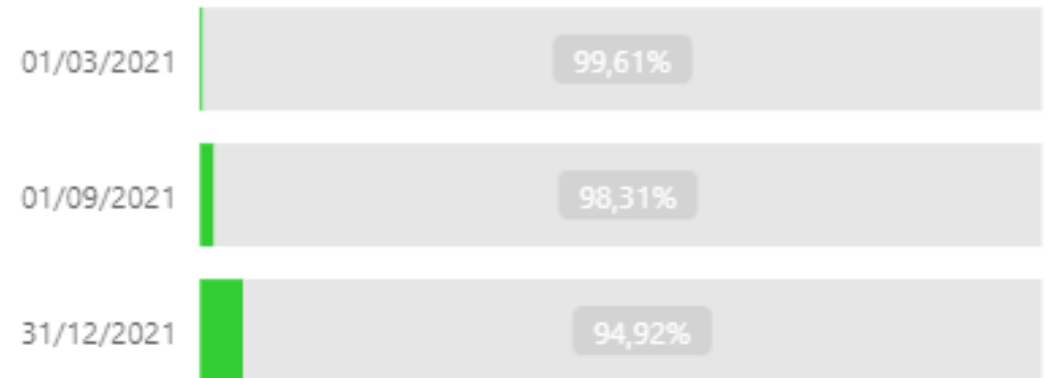


- 1,52 miljard euro of 35,41% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was vastgelegd op meetmoment 31 december 2021. Dat is het dubbele van het bedrag in september 2021 (750 miljoen euro).
- 219 miljoen euro of 5,08 % van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was eind december 2021 vereffend. Dat is 142 miljoen euro meer dan in september 2021.



Vlaamse
overheid

Status VAK / VEK meting 3, 31 december 2021

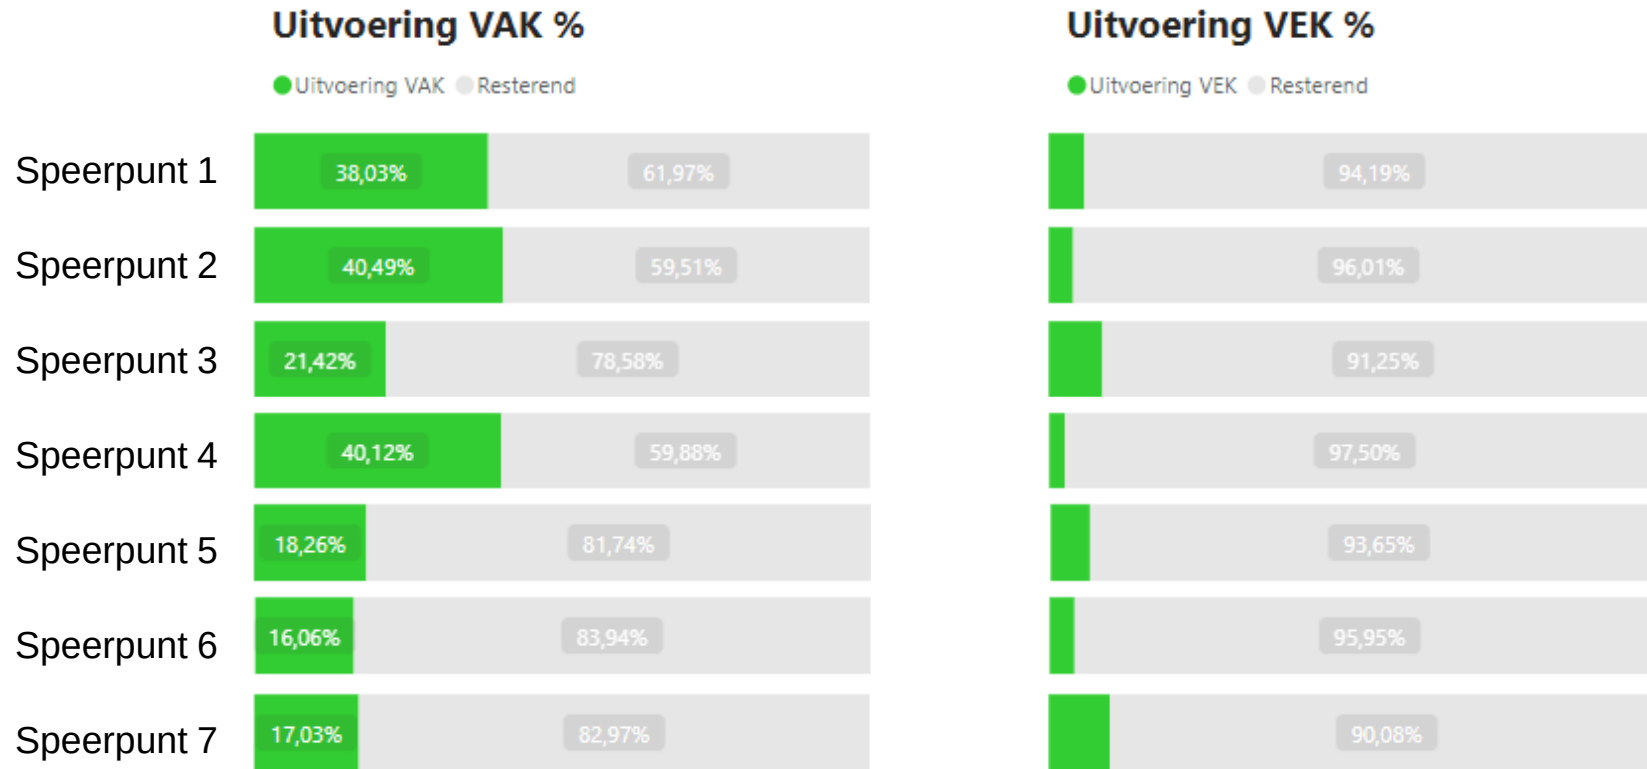

- Men kan vaststellen dat eind december 2021 voor 3 speerpunten (1, 2 en 4) al 38% of meer van de voorziene middelen vastgelegd is.
- Speerpunten 3, 5, 6 en 7 hebben **substantieel lagere vastleggingen**

